


a) Installation des moloks

- Total à installer:
~180 conteneurs

- 62 moloks installés
- 4 moloks pose planifiée en août
- 18 moloks (oppositions en cours)
- 78 moloks (permis de construire prêts à publier)
- 18 moloks (emplacements à finaliser)
- Pas de molok

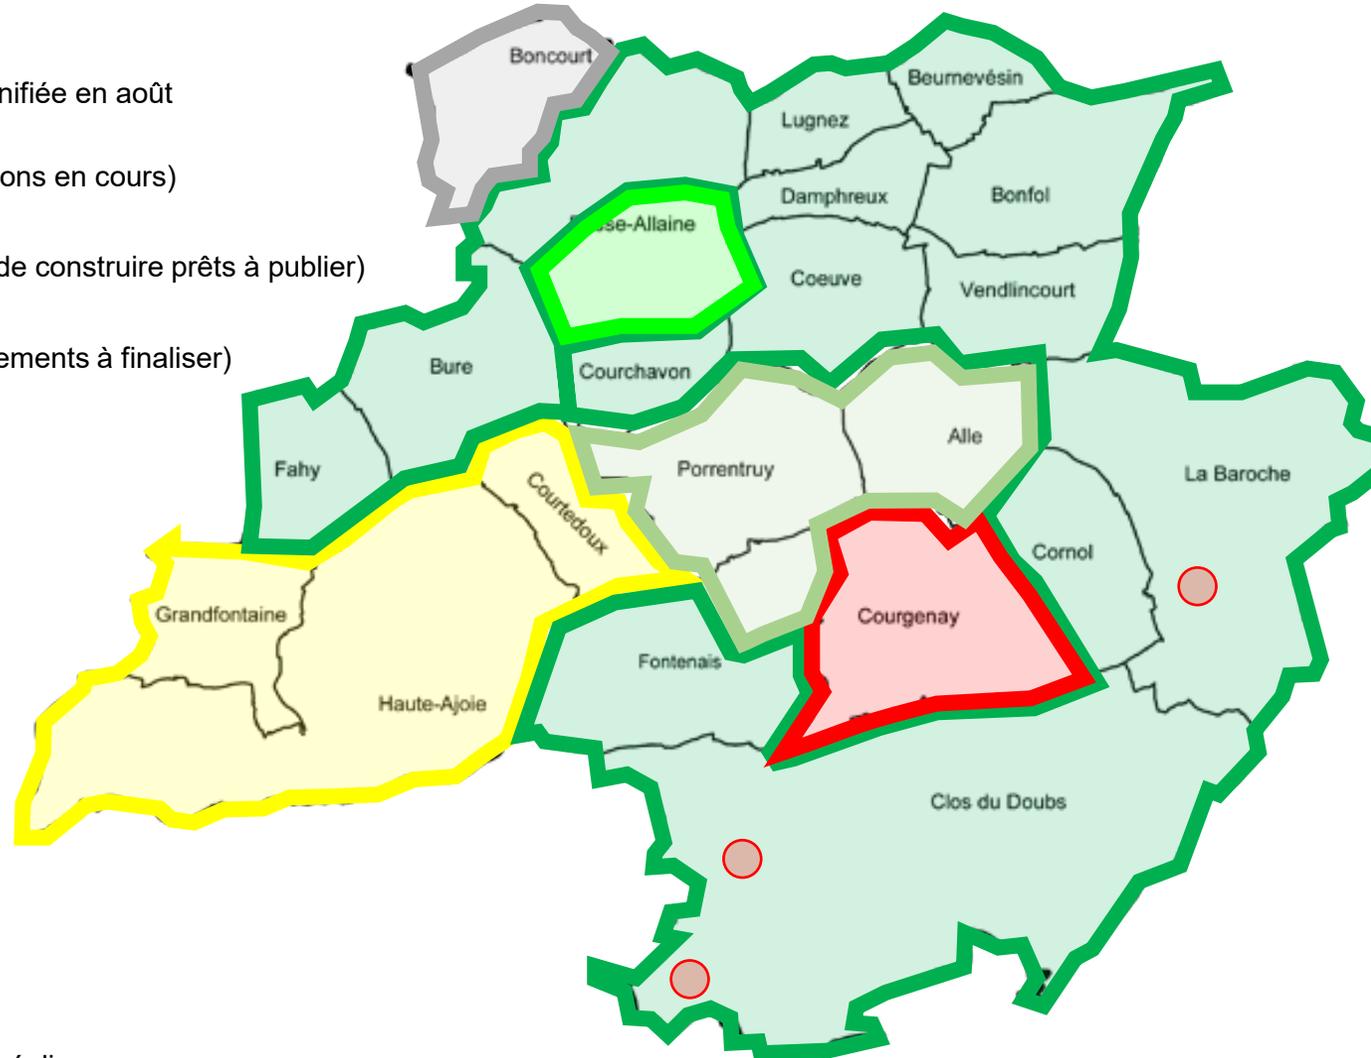

○ Modification PAL à réaliser
