




Installation des moloks

Etat de situation au 29.02.2024

- Total à installer: 193 conteneurs

- 117 moloks installés
- 56 moloks (oppositions en cours sur 3 emplacements)
- 9 moloks (permis de construire en publication)
- 6 moloks (emplacements à finaliser)

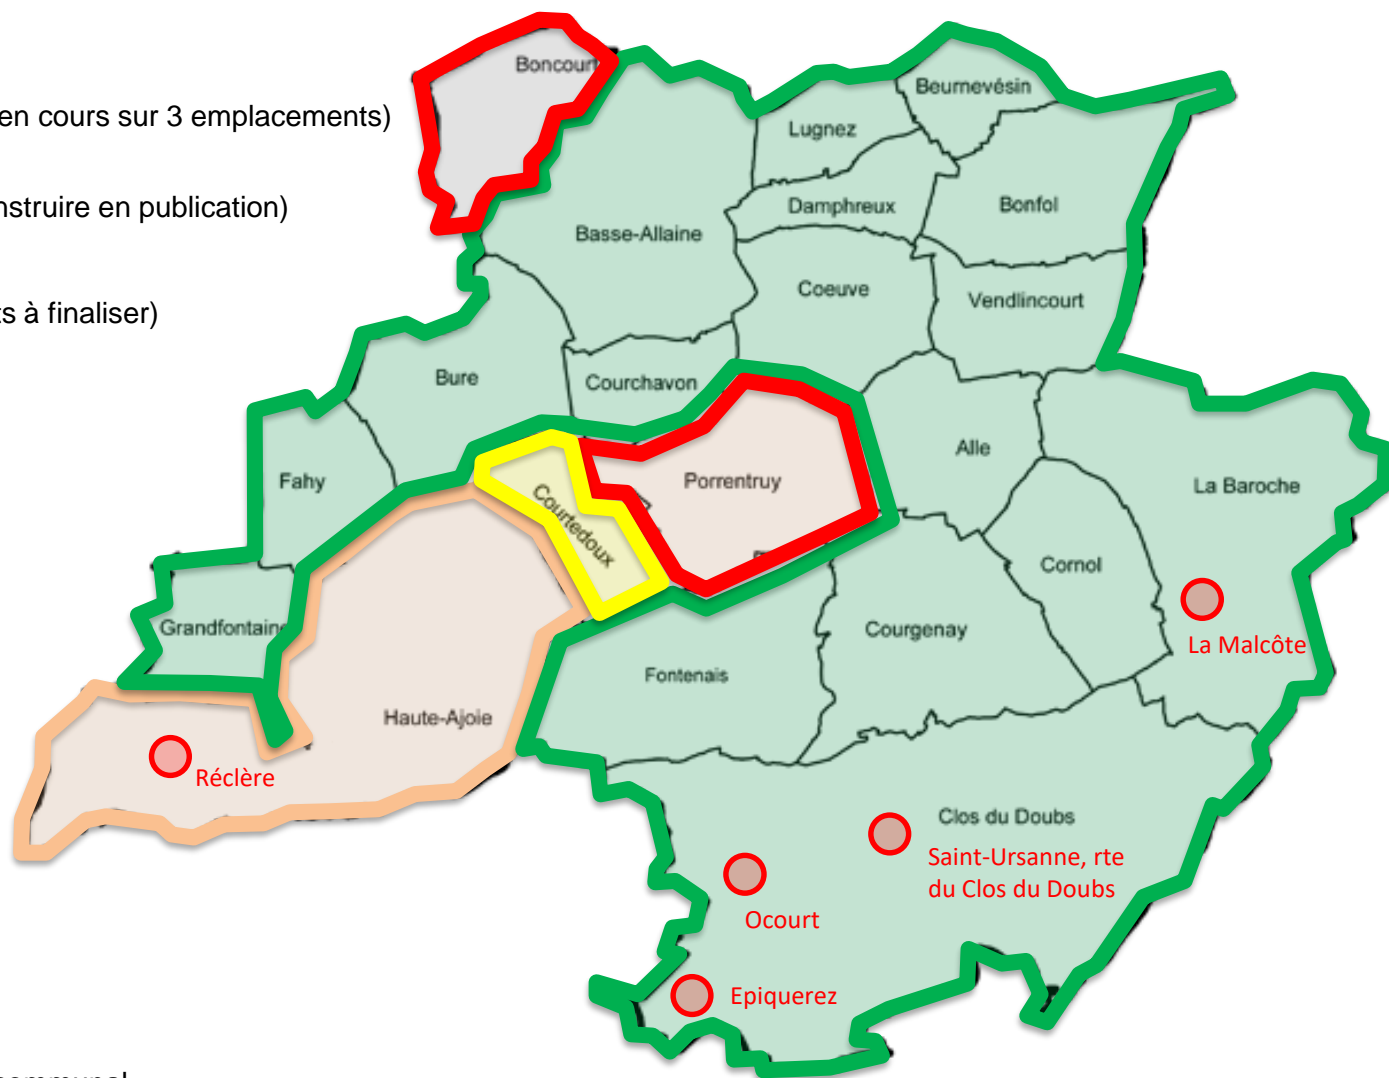

Attendre nouveau PAL communal
