

## Assemblée générale ordinaire du 18 mars 2026, Coeuve



Mormont



Saint-Ursanne

**6. Déchets : information sur l'avancement de la pose des moloks et crédit complémentaire**



# Sommaire

- 1. Historique / Planification**
- 2. Carte emplacement moloks**
- 3. Bilan financier intermédiaire**
- 4. Crédit complémentaire**




# 1. Historique / Planification

- Un crédit cadre de CHF 1'400'000.- pour l'installation des moloks a été voté en AG du SidP le 18 décembre 2018, soit il y a déjà plus de 7 ans.
- A ce jour, 17 Communes sur les 19 du district sont équipés de moloks. Il reste à équiper les communes suivantes:
  - Haute-Ajoie (permis délivré tout récemment et travaux prévus pour avril-mai)
  - Courtedoux (emplacements encore à définir par la commune)
  - Clos du Doubs (reste 3 moloks à poser à Saint-Ursanne, Epiquerez et Ocourt qui sont en attente de la révision du PAL de la commune)
- Au total il reste donc 18 moloks à installer. On espère pouvoir terminer la pose des moloks encore en 2026.
- A noter que le crédit de l'époque était basé sur l'installation de 189 moloks et au final il y en aura 197, soit 8 de plus que prévu.

## 2. Carte emplacements moloks

- **Total de 197 conteneurs**
- Haute-Ajoie : travaux prévus pour avril-mai
- Ocourt, Epiqueurez et 1p à Saint-Ursanne : attente révision PAL
- Courtedoux : emplacements à finaliser

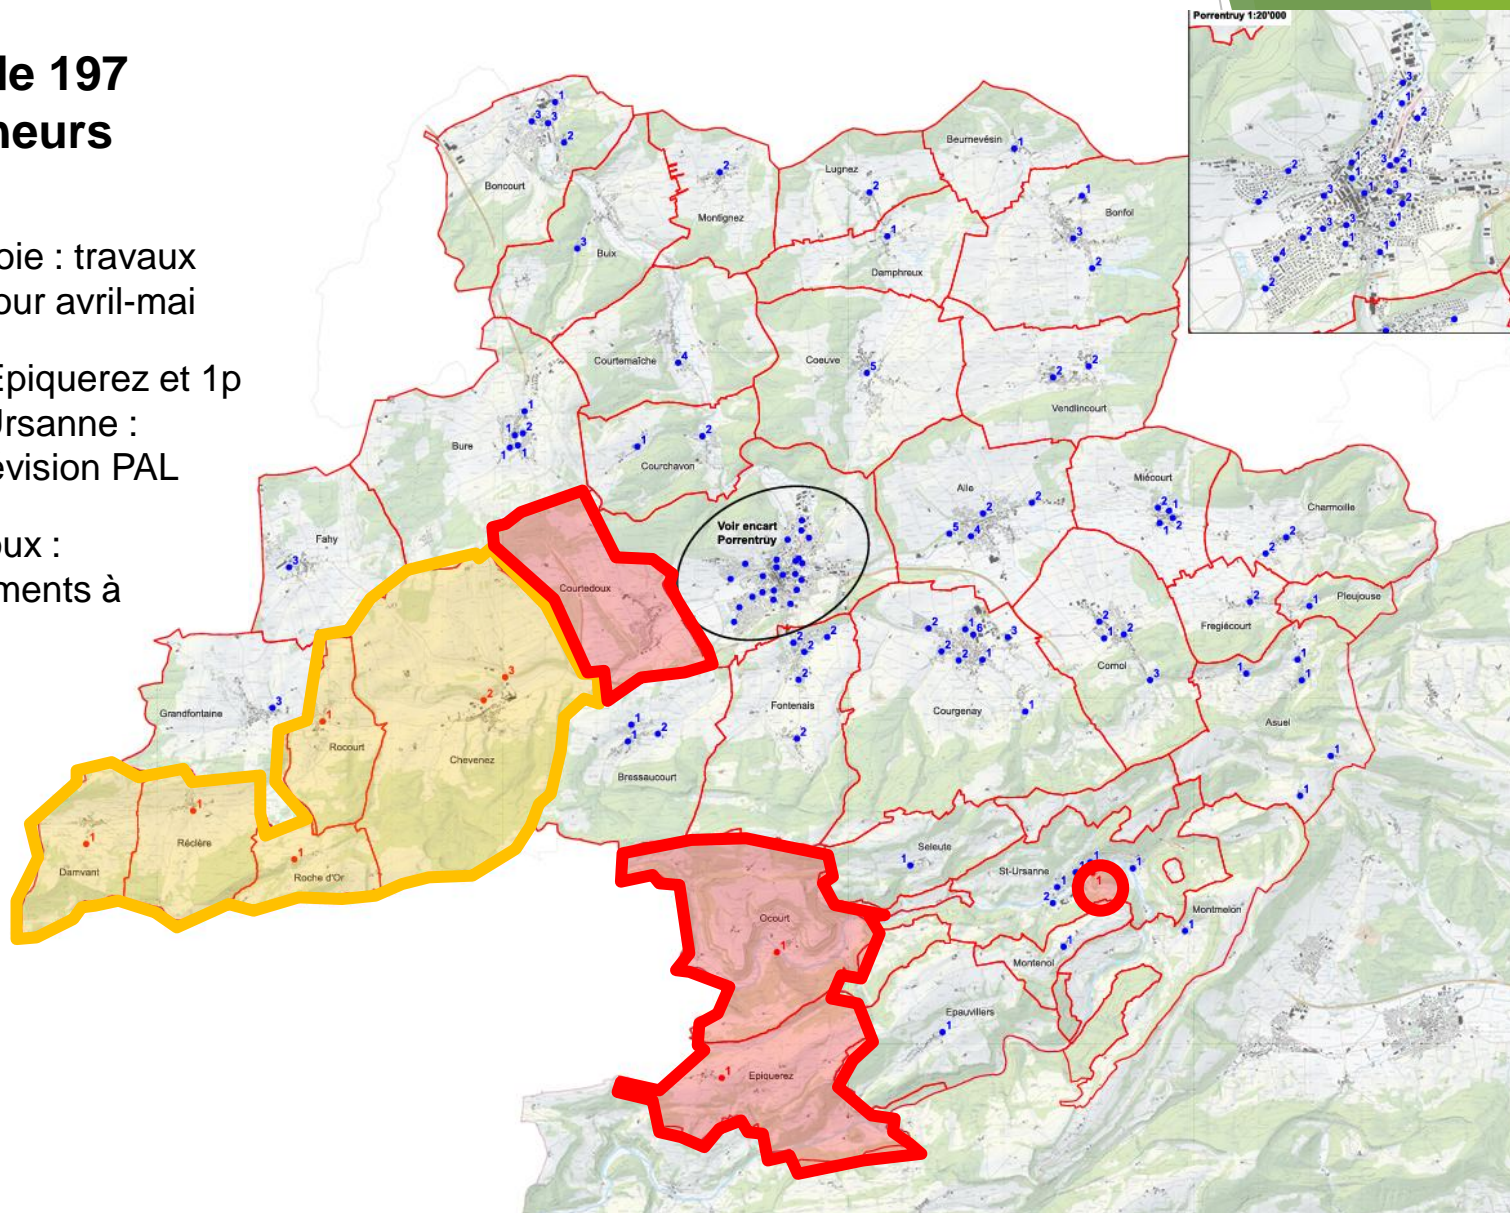



### 3. Bilan financier intermédiaire

Récapitulatif des coûts au 31.12.2025			
Description	Devis pour crédit de base	Coûts effectifs	Remarques
Honoraires CSC déchets pour AO fourniture moloks	25'700.00	22'321.40	
Fourniture + transport moloks	612'360.00	703'060.05	Renchérissement depuis 2018 lié principalement à la hausse des énergies (pétrole et électricité), ~15%
Honoraires ATB pour permis et pose moloks	113'400.00	123'697.00	Plus-value liée à l'abandon de certains emplacements et nouvelles demandes de permis suite à des oppositions, ainsi que participation aux séances de conciliation
Génie civil pose moloks	529'200.00	387'343.65	
Rachat anciens moloks La Baroche	30'000.00	32'310.00	TVA non prévu dans le crédit de base
Divers et imprévus	89'340.00	144'562.49	
<i>Frais bancaires et intérêts intercalaires</i>		47'746.62	Durée beaucoup plus longue impliquant des intérêts intercalaires plus importants que prévu
<i>Imputations internes</i>		94'576.07	Procédures plus complexes que prévues et nombreuses oppositions traitées par le chef de service
<i>Frais divers</i>		1'167.45	Achat cadastre district pour demandes de permis
<i>Autocollants pour moloks</i>		1'072.35	Pas prévu dans crédit de base
<b>TOTAUX</b>	<b>1'400'000.00</b>	<b>1'413'294.59</b>	

- A noter que le crédit de l'époque était basé sur l'installation de 189 moloks et au final il y en aura 197, soit 8 de plus que prévu.
- Les coûts effectifs mentionnés ci-dessus correspondent à l'installation de 170 moloks. Il en reste donc 27 moloks pour lesquels nous recevront encore des factures.



## 4. Crédit complémentaire

Récapitulatif Description	Coûts prévisibles	Remarques
Fourniture + transport moloks	40'230.06	Solde moloks pré-commandé + moloks supplémentaires
Honoraires pour permis et pose moloks selon contrat de base	12'000.00	Prestations de base pour moloks supplémentaires
Complément d'honoraires pour prestations complémentaires	126'000.00	Prestations supplémentaires liées à la complexification des procédures et des nombreuses oppositions à traitées ainsi qu'études de nouveaux emplacements.
Génie civil pose moloks	46'000.00	Pose moloks à Haute-Ajoie, Courtedoux et solde Clos du Doubs
Divers et imprévus	9'300.00	
<i>Frais bancaires et intérêts intercalaires</i>	<i>4'800.00</i>	Intérêts intercalaires et frais bancaires
<i>Imputations internes</i>	<i>4'000.00</i>	Estimation des heures encore à réalisées par le chef de service
<i>Frais divers</i>	<i>500.00</i>	Réserve
Déplacement actuel du crédit de construction	13'294.59	
<b>TOTAUX</b>	<b>246'824.65</b>	



## 4. Crédit complémentaire

- Sur la base des informations précédentes, le comité du SidP, dans sa séance du 23 février 2026, a voté un crédit complémentaire de :

**CHF 247'000.-**

- A noter que les 8 moloks supplémentaires par rapport au nombre prévu dans le crédit de base représente un montant d'environ CHF 60'000.-.
- Si on déduit ce montant du crédit complémentaire qui n'est pas imputable au renchérissement mais à une commande supplémentaire, la plus-value finale liée à la durée du mandat (8 ans), au renchérissement et aux difficultés de procédure rencontrées (oppositions, PAL, etc.) se monte à CHF 187'000.-, soit environ 13%.
- Ce crédit complémentaire permettra de terminer l'installation des moloks dans l'ensemble des localités du district.
